
MY MOLO

100 Popup-Hotelzimmer / Aufstellplan

10 Reihen à 10 Zimmer · 5 Gänge · Eingänge einander gegenüber · mit Stromeinspeisung und Rangierflächen

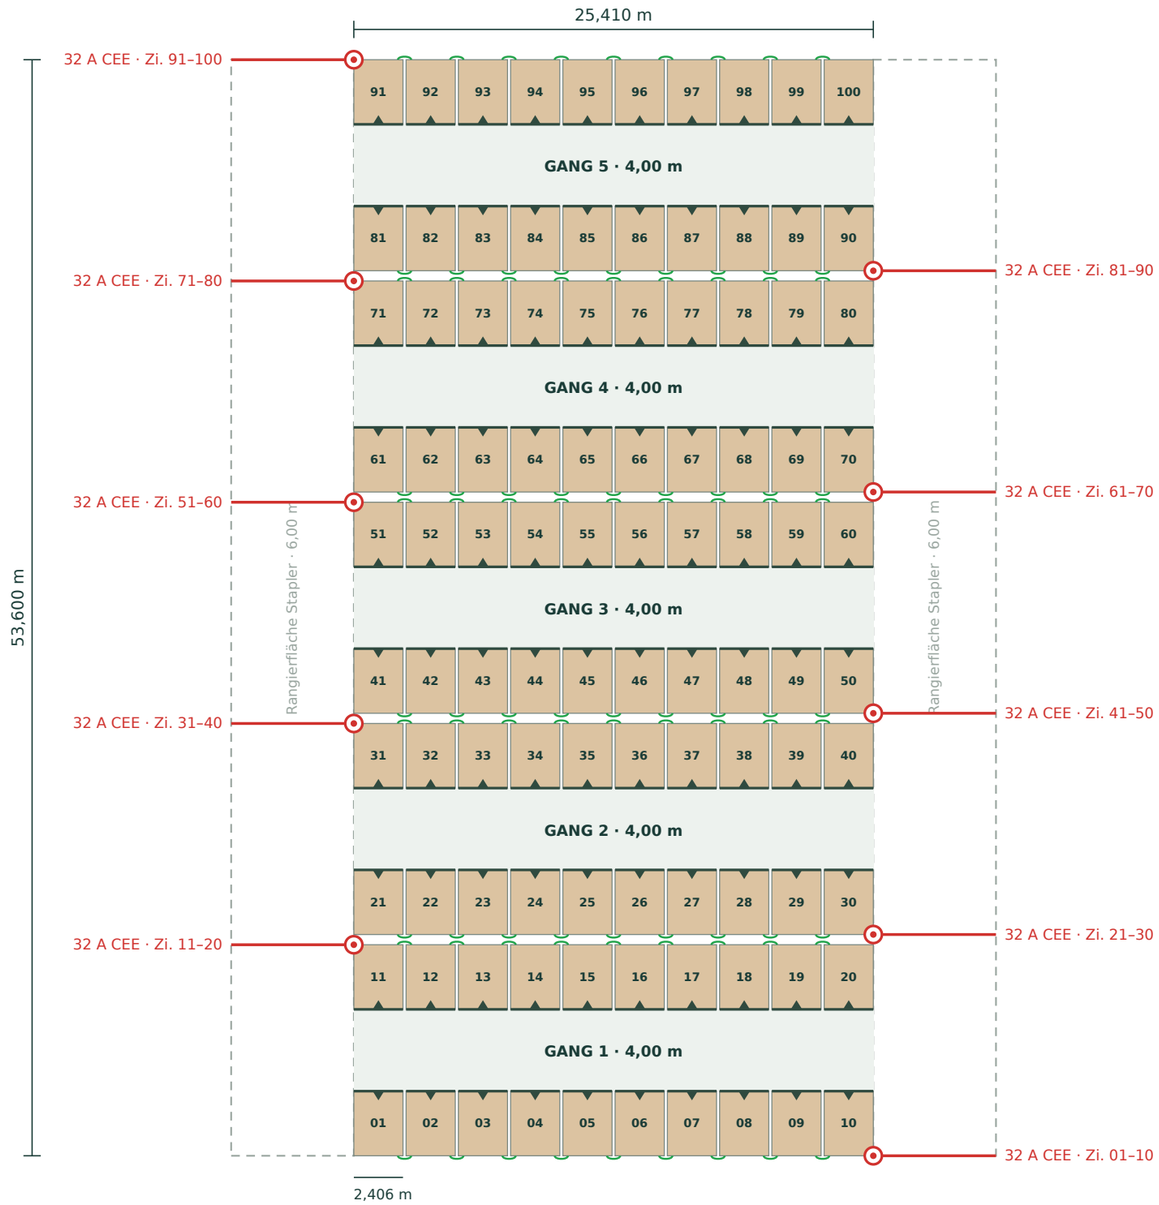

AUFSTELLDATEN

100 Einheiten / 10 Reihen
5 Gänge à 4,000 m
Breite: 25,410 m
Tiefe: 53,600 m
Fläche: 1.361,98 m²
Einheit B × T × H: 2,406 × 3,160 × 2,575 m
Seitlicher Abstand: 0,150 m · Rücken-/Fensterseite: 0,500 m

HEBETECHNIK

2 geländefähige Stapler mit Seitenhub
3 t Hubkraft, 4,5 m Hubhöhe
optional Kran
kein Radlader oder Teleskopstapler
empfohlenes Modell: Manitou M30
Staplertaschen seitlich an beiden Seiten
der Zimmer · 6 m Rangierabstand

STROM

10 × 32-A-CEE-Zuleitung (je 10 Zimmer),
mind. 4 mm² · Veranstalterseitig
Unterverteilung durch My Molo:
je 10 Zimmer mit 60-cm-Verbindungskabeln

LEGENDE

- Dunkelgrüne Kante + Dreieck: Eingang
- Roter Punkt: Stromeinspeisung, 32 A CEE (Veranstalter)
- Grün: Verbindungskabel 60 cm (My Molo)
- Gestrichelt: Rangierfläche Stapler 6 m

DRUCK / MASSSTAB

A3 bei 100 % · 1:300

0 — 10 m


PLANUNGSHINWEIS

Beispielaufstellung ohne äußere Randwege, Zufahrt, Sanitär- und Serviceflächen. Standortbezogene Flucht- und Brandschutzwege sind gesondert zu planen. Richtwert ca. 15 m² pro Einheit inkl. Rangierabstand und Rettungswegen; Detailplanung projektbezogen. Abstände sind Vorgaben für dieses Konzept, keine pauschalen Mindestabstände.

MY MOLO

100 Popup-Hotelzimmer / KI-Visualisierung

10 Reihen à 10 Zimmer · Hellgraue Dächer · Holzfassade und grüne Türen mit My-Molo-Logo

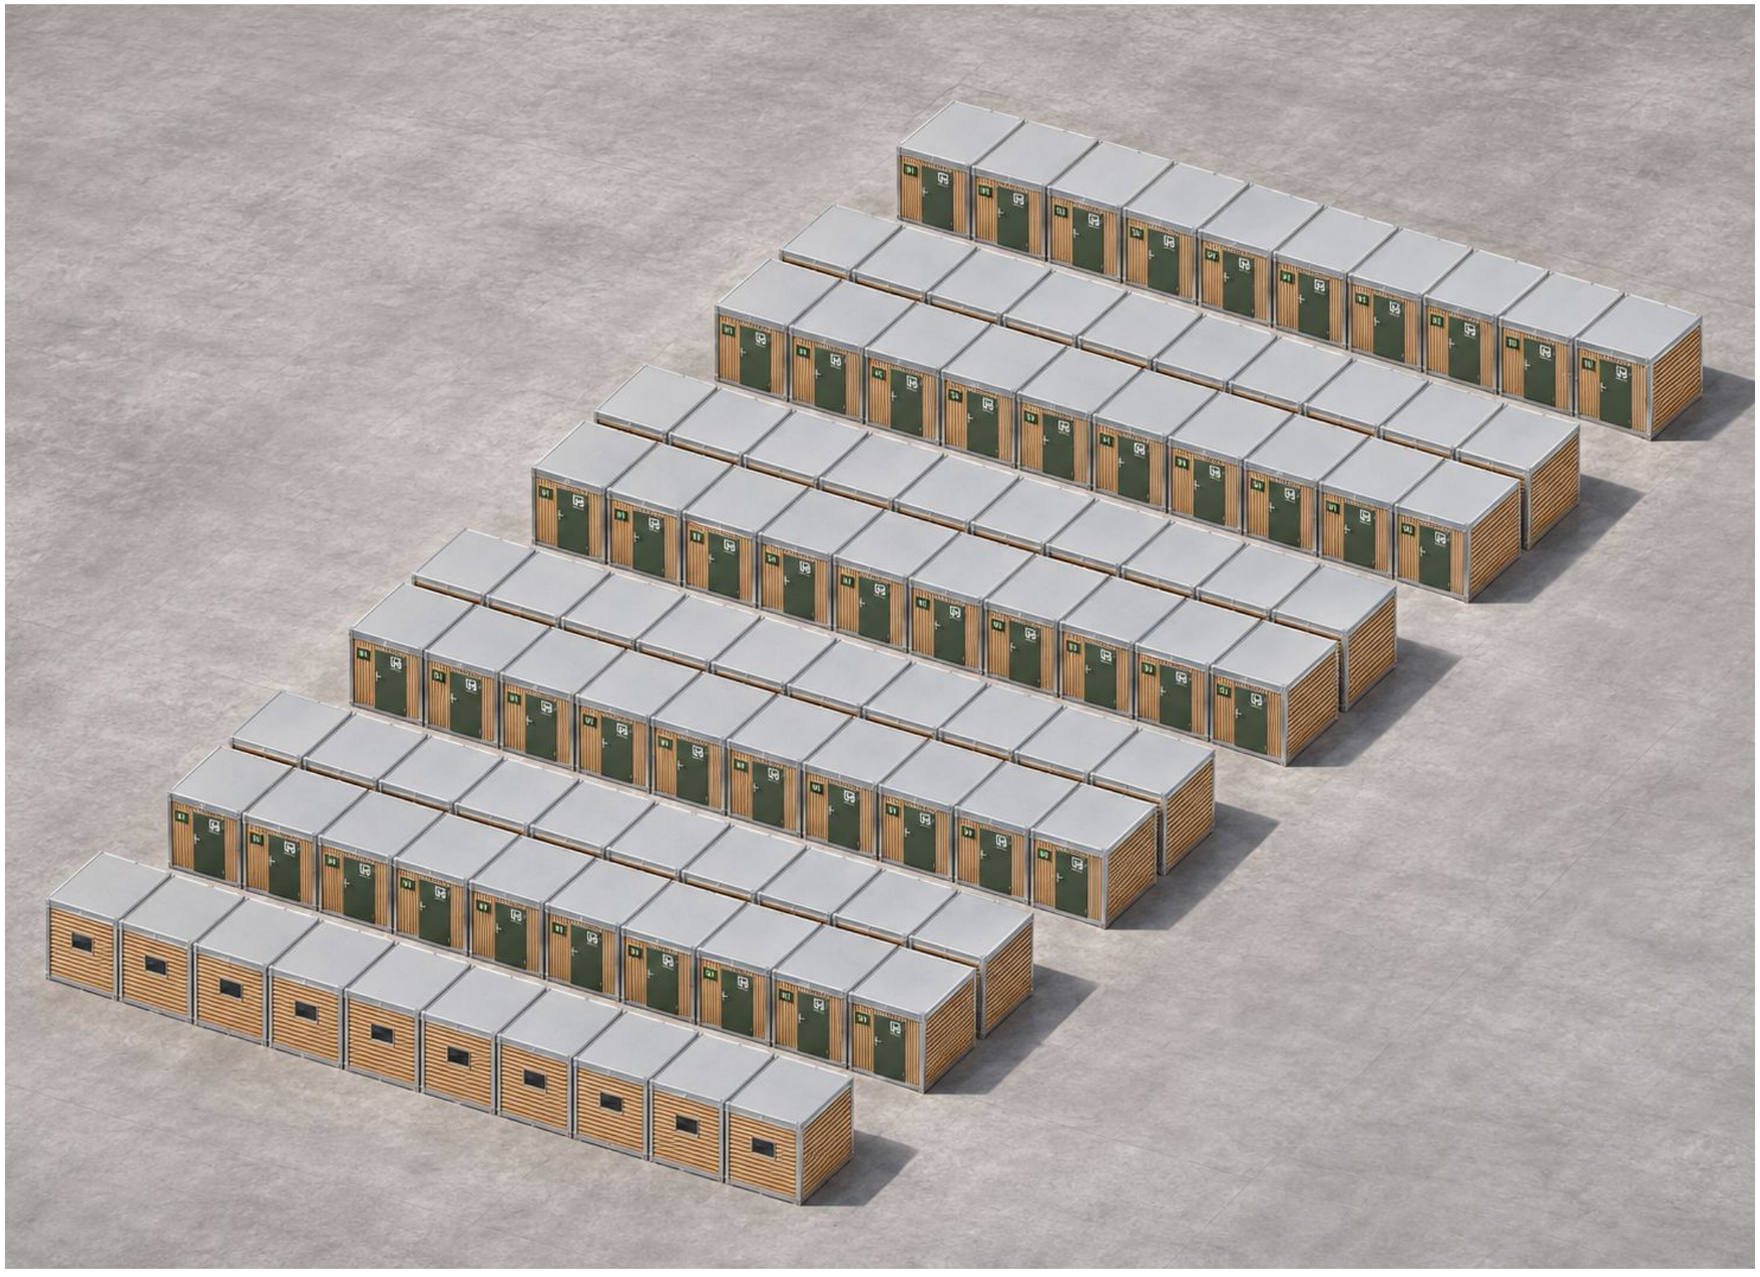

KI-generierte illustrative Ansicht nach Produktfotos und Geometriemodell.

Darstellungsdetails und Abstände können abweichen. Maßgeblich ist der bemaßte Aufstellplan auf Seite 1.
